

Projektisuunnitelma - Luonnos

Ohjausryhmän (VATE) kokoukseen 7.12.2017,
Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12 Lahti



Sisällys

1. Johdanto (dia no:3)
2. Valmistelun organisoituminen (dia no:4)
3. Asiavalmistelun toimeenpano (dia no:5)
4. Muutosvisio, arvot ja kärkihankkeet (dia no:17)
5. Aikajana (dia no:18)
6. Muutosviestintä (dia no: 19)
7. Riskianalyysi (dia no: 20)
8. Seuranta ja arviointi (dia no:21)

1. Johdanto

Projektisuunnitelman tavoitteena on kuvata Päijät-Hämeen väliaikaishallinnon ja valmistelutyön organisointi, hahmottaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen laaja-alainen kokonaisuus. Projektisuunnitelma kuvaa esivalmistelun organisoitumista ja väliaikaishallinnon tehtäviä, kunnes maakuntavaltuusto ottaa ne hoitaakseen. Suunnitelmassa kuvataan lisäksi valmistelusta vastaavan projektitoimiston työtä vuoden 2019 loppuun asti ja uuden maakunnan asiavalmistelu.

Projektisuunnitelma on valmistelun etenemisen ja tekemisen runko. Sen on tarkoitus päivittyä työn edetessä aina uusien maakuntien käynnistymiseen asti.

Projektisuunnitelman ensimmäinen luonnosversio on ollut avoimella lausuntokierroksella kesällä 2017 ja se on käsitelty maakuntahallituksen kokouksessa 5.6.2017.

2. Valmistelun organisoituminen

VÄLIAIKAISHALLINTO, ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄ (VATE)

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: 3 jäsentä + 3 varajäsentä
Hämeen ELY-keskus: 1 jäsen + 1 varajäsen
Hämeen TE-toimisto: 1 jäsen + 1 varajäsen
Päijät-Hämeen liitto: 1 jäsen + 1 varajäsen
Päijät-Hämeen pelastuslaitos: 1 jäsen + 1 varajäsen
Lahti (varajäsen Lahti)
Lahti (varajäsen liitti)
Hollola (varajäsen Hartola)
Heinola (varajäsen Kärkölä)
Orimattila (varajäsen Padasjoki)
Asikkala (varajäsen Sysmä)

Puheenjohtaja Jari Parkkonen (Päijät-Hämeen liitto),
I varapuheenjohtaja Jarmo Paukku (Hämeen ELY-keskus)
II varapuheenjohtaja Eetu Salunen (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä)

PROJEKTITOIMISTO (30.11.2017)

Muutosjohtaja Seppo Huldén
Arja-Tuulikki Wilén, projektipääällikkö
Veli Penttilä, hallintojohtaja
Ville Majala, projektikoordinaattori
Sari Mertsalmi, toimistosihiteeri,
Anu Mäkelä, johtava controller
Aapo Pispä, asiantuntija
Petri Pekkala Nelli Hakkarainen ICT-asiantuntijat
Riikka Järvinen, asiakkuuspääällikkö

VASTUUVALMISTELIJAT

POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

Maakuntahallitus + vasemmistoliiton edustaja Elisa Lientola
+ maakuntavaltuuston puheenjohtajisto
(Rostedt, Nieminen, Rehula) + PHLiiton edustaja.

KUNTAJOHTAJAT

YKKÖSKETJU

Kuntien hallitusten ja valtuustojen 1-puheenjohtajat,
kuntajohtajat,
Päijät-Hämeen maakuntahallituksen ja -valtuuston 1-
puheenjohtajat sekä ja Hyvinvointiyhtymän
hallituksen ja -valtuuston 1-puheenjohtajat

HENKILÖSTÖFOORUMI

Henkilöstöjärjestöjen edustajat , kokoontuu säännöllisesti

3. Asiavalmistelun toimeenpano

1. Maakunnan palvelut
2. Maakunnan organisoituminen
3. Siirtymävaiheen tehtävät

3.1. Maakunnan palvelut

Vastuuvalmistelijat laativat maakunnan palveluita koskevat toimeenpanosuunnitelmat vuosille 2018-2019 joulukuussa (31.12.2017 mennessä). Toimeenpanosuunnitelmat viedään sähköiseen projektisalkkuun (Thinking Portfolio), johon annetaan laajasti lukuoikeuksia.

Alueiden kehittämisen palvelut	• Kehittämisjohtaja Riitta Nieminen
Alueiden käytön palvelut	• Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen
Kasvupalvelut	• Johtaja Jarmo Paukku
Ympäristöterveydenhuolto	• Ympäristöterveyskeskuksen johtaja Silja Mäkelä
Ympäristöpalvelut	• Vesihuoltoasiantuntija Timo Virola
Liikenne	• Erityisasiantuntija Tapio Ojanen
Maatalous- ja elintarviketuotannon palvelut	• Yksikön päällikkö Kari Kivikko
Pelastus- ja turvallisuustehtävät sekä valmius- ja varautumistehtävät	• Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

Sote-palvelut

Sote-palvelut	Henkilöt
Sote-koordinaatio (ad. 31.12.2017)	Veli Penttilä (Ismo Rautiainen 2018)
Maakunta sote-palvelujen järjestäjänä	Ismo Rautiainen
Sote-palveluiden järjestäminen ja tuotanto	Ismo Rautiainen
Sote-palvelutuotannon seuranta	Ismo Rautiainen
Sote-ensihoito	Timo Jama
Sote-hyvinvoinnin edistäminen	Risto Kuronen

Alueiden kehittämisen palvelut

Alueiden kehittämisen palvelut	Vastuuvalmistelija: Riitta Nieminen / Päijät-Hämeen liitto
Aluekehittämisen koordinointi	Riitta Nieminen / Päijät-Hämeen liitto
Liikennejärjestelmäsuunnittelu	Tapio Ojanen / Päijät-Hämeen liitto
Strategiatyö	Riitta Nieminen / Päijät-Hämeen liitto
Ennakointi	Riitta Nieminen / Päijät-Hämeen liitto
Koulutustarpeiden ennakointi	Jukka Mikkonen / Päijät-Hämeen liitto
Edunvalvonta	Juha Hertsi / Päijät-Hämeen liitto
Kulttuuri	Riitta Nieminen / Päijät-Hämeen liitto
Maakunnan tilan ja kehityksen seuranta	Jukka Mikkonen / Päijät-Hämeen liitto
Kansainvälisten asioiden koordinointi	Marko Mälly / Päijät-Hämeen liitto

Alueiden käytön palvelut

Alueiden käytön palvelut	Vastuuvalmistelija Riitta Väänänen / Päijät-Hämeen liitto
Maakuntakaavoitus	Riitta Väänänen / Päijät-Hämeen liitto
Kunnan alueidenkäytön suunnittelun ja rakennusvalvontatoimen järjestämisen edistäminen	Kirsti Nieminen / Hämeen ELY-keskus
Kulttuuriympäristön hoidon edistäminen – strategiat, ohjelmat ja selvitykset	Kirsti Nieminen / Hämeen ELY-keskus

Kasvupalvelut

Kasvupalvelut	Vastuuvalmistelija: Jarmo Paukku / Hämeen ELY-keskus
Henkilöasiakaspalvelut	Jaana Hokkanen / Hämeen TE-toimisto
Yritysassiakaspalvelut	Kari Sartamo / Hämeen ELY-keskus
Maahanmuutto	Anita Salonen / Hämeen ELY-keskus

Liikenne

Liikenne	Vastuuvalmistelija: UUELY / KASELY
Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen	Tapio Ojanen / Päijät-Hämeen liitto
Liikenteen suunnistelu	Tapio Ojanen / Päijät-Hämeen liitto
Tienpidon suunnittelu	Tapio Ojanen / Päijät-Hämeen liitto
Liikennesuunnittelun yhdistäminen maankäytön suunnitteluun	Tapio Ojanen / Päijät-Hämeen liitto
Joukkoliikenne	Tapio Ojanen / Päijät-Hämeen liitto

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut	Vastuuvalmistelija: Timo Virola / Hämeen ELY-keskus
Vesien hoito	Harri Mäkelä / Hämeen ELY-keskus
Vesitalous	Timo Virola / Hämeen ELY-keskus
Kalatalous	Jorma Kirjavainen / Hämeen ELY-keskus

Maatalous- ja elintarvikehuollon palvelut

Maatalous- ja elintarvikehuollon palvelut	Vastuuvalmistelija: Kari Kivikko/Hämeen ELY-keskus
Maatalous	Kari Kivikko / Hämeen ELY-keskus
Maaseudun kehittäminen	Timo Kukkonen / Hämeen ELY-keskus
Lomituspalvelut	Taina Blomqvist / Sysmä

Pelastustoiminta - ja varautumistehtävät

Pelastustoiminta- ja varautumistehtävät	Vastuuvalmistelija: Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen / Pelastuslaitos
Pelastustoimialan palvelut	Merja Saasmo / Pelastuslaitos
Valmius- ja varautumistehtävät	Veli-Pekka Niemikallio / Pelastuslaitos
Maakunnallinen tilannekuva	Veli-Pekka Niemikallio / Pelastuslaitos

3.2. Maakunnan organisoituminen

Maakunnan organisoituminen	Vastuuvalmistelija
Maakunnan hallinto ja konsernipalvelut	Hallinnonvalmistelija / Projektitoimisto (valintaprosessi kesken)
Väliaikaishallinnon rakentaminen	Muutosjohtaja Seppo Huldén / Projektitoimisto
Talous	Anu Mäkelä / projektitoimisto
Omaisuus ja sopimukset	Hallinnonvalmistelija / Projektitoimisto (valintaprosessi kesken)
Henkilöstö	
Demokratia ja osallisuus	Valmistelija / Projektitoimisto (valintaprosessi kesken)
Viestintätehtävät	Valmistelija / Projektitoimisto (valintaprosessi kesken)

3.3. Siirtymävaiheen tehtäviä

Tehtävät	Henkilöt
Muutosjohtaja	Seppo Huldén
Projektipäällikkö	Arja-Tuulikki Wilén
Projektikoordinaattori	Ville Majala
Projektiassistentti	Sari Mertsalmi
ELY-keskus yhteyskoordinaatio	Riikka Järvinen
Maakuntatalouden simulointi (ad. 21.12.2017)	
Työterveyshuoltoa koskevien asioiden koordinointi-järjestäminen ja toiminnallinen integraatio	HYKY nimeää
Yhdyspinta-asiat (as. 31.12.2017)	Tehtävä on täytetty tällä hetkellä palvelusopimuksella: jatketaan sopimusta vai rekrytoidaan
ICT-suunnittelu - asiantuntija (ad. 31.12.2017)	Nelli Hakkarainen
TKI-organisointi	Timo Louna
Valmistelurahoituksen haku, seuranta ja raportointi	Anu Mäkelä
Sote-pilotit ja muutosagentit - koordinointi	HYKY nimeää
Maakuntakonsernin rakentaminen	muutosjohtaja
Palvelujen järjestämisen koordinointi/ valmistelu yhteistyössä	100 % valmistelija


4. Muutosvisio, arvot ja kärkihankkeet

Laaditaan maakunnallisena yhteistyönä työpajassa tammikuussa 2018

5. Aikataulus

Projektitoimisto ja vastuuvalmistelijat laativat maakunnan valmistelun aikajanan joulukuussa 2017. Esimerkki alla.

UusiPH valmistelutehtävät ad.31.5.2018

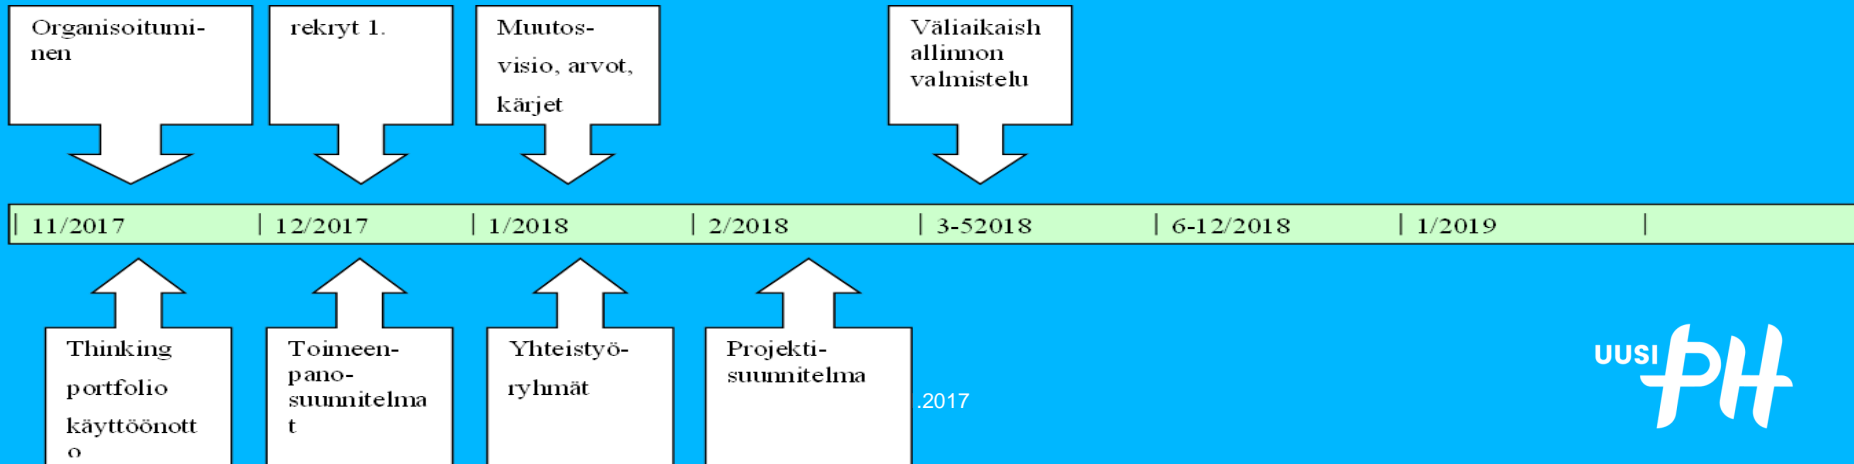

6. Muutosviestintä

- Viestintäsuunnitelma valmistuu vuoden 2018 alkuun.

7. Riskianalyysi

- Projektitoimisto ja vastuuvalmistelijat laativat maakunnan valmistelun riskianalyysin tammikuussa 2018.

8. Seuranta ja arviointi

Seuranta- ja arviointisuunnitelma laaditaan alkuvuodesta 2018 seuraavat tekijät huomioon ottaen:

- THL tulevien maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja arviointi
- Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnalliset seuranta- ja arviointisuunnitelmat
- Päijät-Hämeen valmistelulle asetetut kriteerit
